

आ.व.२०७९।०८० मा संचालित योजनाहरू र प्रशासन शाखाको बार्षिक प्रगति समिक्षा

राजिमान बुढा
प्रशासन योजना तथा अनुगमन शाखा
प्रमुख
बराहताल गाउँपालिका बड्डीचौर, सुर्खेत
२०८०, कार्तिक ०२ गते

बराहताल गाउँपालीकाको नक्शा

बराहताल गाउँपालिका, सुर्खेत



बराहताल गाउँपालीकाको परिचय

- पालीकाको कुल क्षेत्रफल ४५५.०९ वर्गकीमी
- कुल जनसंख्या २५९४३ (म.१३७१७, पु.१२२३६)
- कुल घरधुरी संख्या ६१६९
- वडा संख्या १० वटा
- कूल साक्षरता दर ७७.७ (म.७०.४ पु.८५.९)
- जिल्ला सदरमुकाम बाट दुरी १२ किमि देखि ४१ किमी
- अल्टीच्युट ३०० देखि १८०० मिटर
- औसत वार्षिक वर्षा १०० मिलिमिटर
- वार्षिक तापक्रम न्यु. ६ देखि अधि.३९ डि.से



नेपाल सरकार

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

संगठन विकास प्रशासक

पत्र संख्या: त. वि. २०७५ / ७६

चलानी संख्या: ५१५

मिति: २०७५/०९/१५

विषय: संगठन संरचना र दरबन्दी तैरिज ।


श्री स्थानीय तहहरू (सबै)

गवै स्थानीय तहहरू (गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका) र मन्तर्गत रहने कृषि विकास शाखा/कृषि विकास केन्द्र र गणु सेवा केन्द्रहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी तैरिजको प्रतिवेदनमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) वट मिति २०७५/०९/०९ मा रैहाय अनुसार थप गरी स्वीकृत भएको हुदाँ आवश्यक जानकारीका लागि अनुरोध छ ।

रैहाय:


१. स्थानीय तहको अनुसूची १.१ र अनुसूची २.१ मा प्रत्येक गाउँपालिकामा नेपाल स्वास्थ्य सेवा, क.न. समूह, प.हे.न. (५/६/७ तह) पद संख्या एक थप गर्ने ।
२. नगरपालिका र गाउँपालिकामा रहने प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत पद सघ अन्तर्गतको दरबन्दीमा लायम गर्ने ।

उक्त संगठन संरचना र दरबन्दी पद दर्ताका लागि राष्ट्रिय किताबखाना पठाइ सकिएको व्यवहार समेत जानकारीका लागि अनुरोध छ ।


राज कुमार श्रेष्ठ
प्रमुख अधिकृत

बराहताल गाउँपालिकाको संगठन संरचना

अनुसूची-१.१

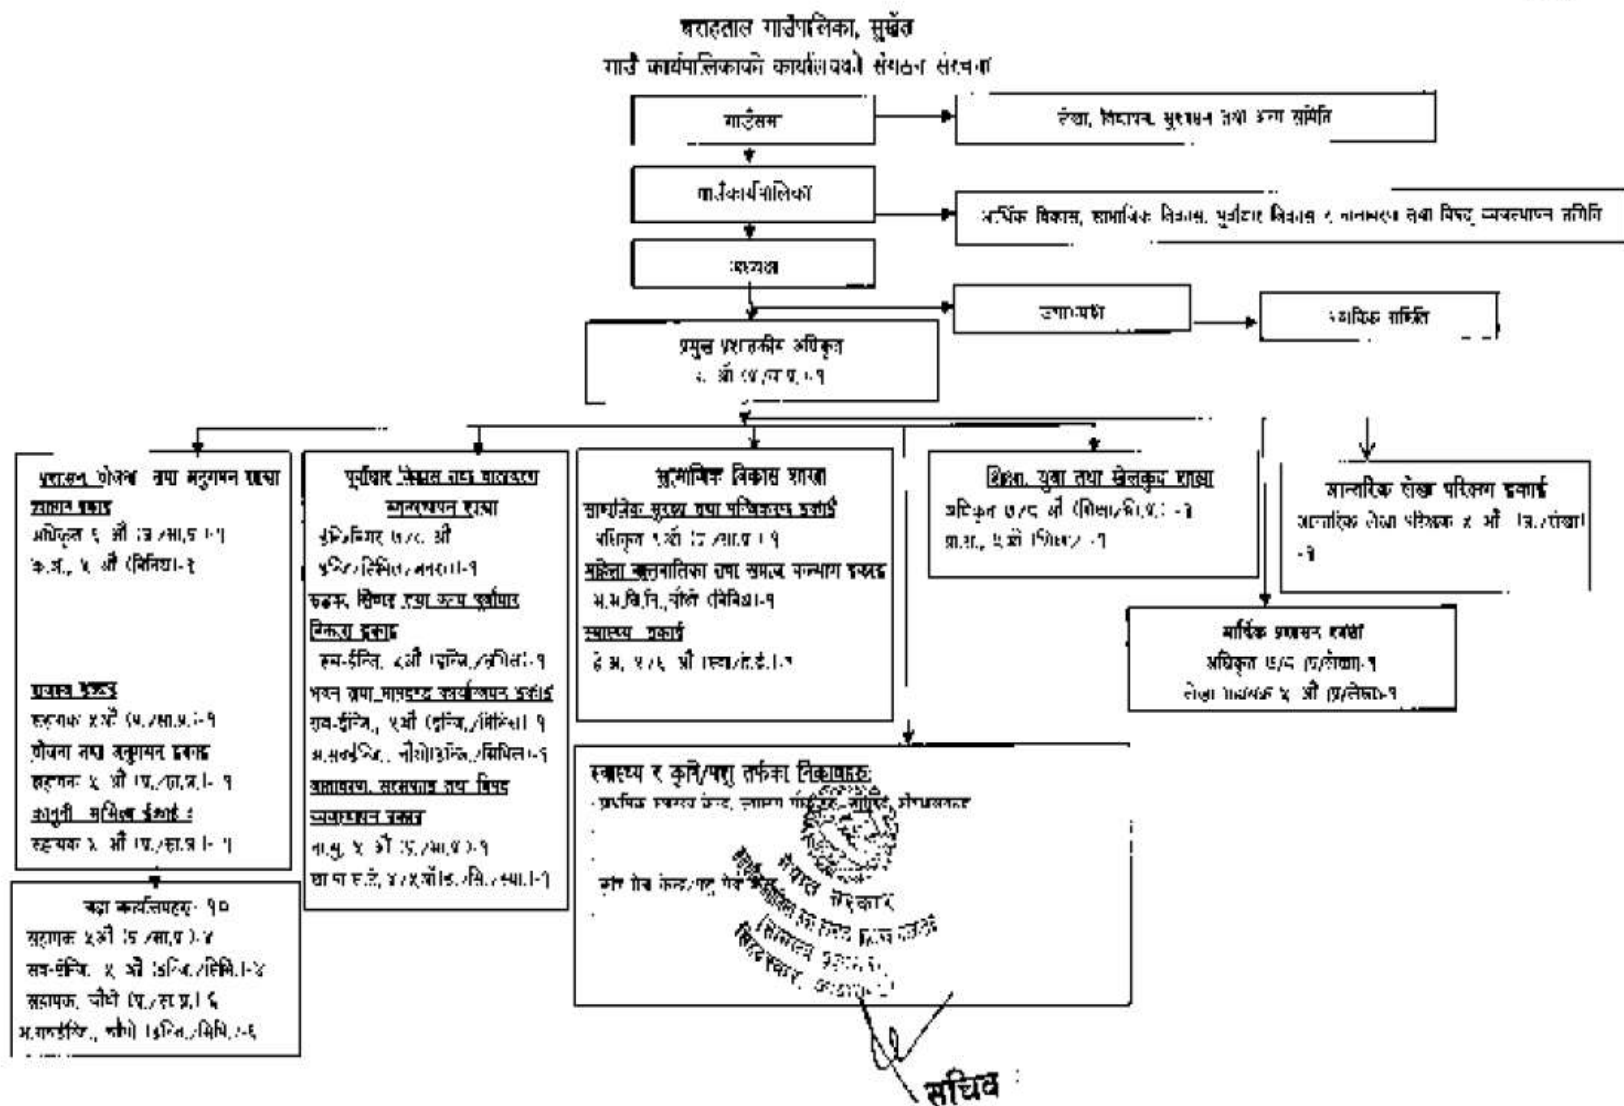

बराहताल गाउँपालिकाको दरबन्दी तरेरिज

अनुसूची २

बराहताल गाउँपालिका, सुर्खेत
गाउँ कार्यशाहिकाको कार्यालयको दरबन्दी तरेरिज

क्र.सं.	पद	वर्ग	सेवा	रकृ	जनासङ्ख्या	गरीमृ-३ दरबन्दी	न-व सेवाबाट लुकायोमन हुने दरबन्दी	बोकी दरबन्दी	केतिगव
१	अधुष प्रसासकीय अधिकृत	८ जी	अशासन	र.प्र.		१			
२	इन्जिनियर	७/८ जी	इन्जि.	विधित		१		१	
३	अधिपुन	७/८ जी	मिडा	वि.प्र.		२		१	
४	महापुन	७/८ जी	अशासन	संस्था		१		२	
५	अधिकृत	६ जी	अशासन	सा.प.		२		२	
६	सांस्कृतिक आरुप गैरुड	५ जी	अशासन	संस्था		१		१	
७	रुडपुन	५ जी	अशासन	सा.प.		२		४	
८	कम्प्युटर अपरेटर	५ जी	इन्जि.			०		१	
९	संस्था महापुन	५ जी	अशासन	संस्था		१		१	
१०	पा. र.	५ जी	इन्जि.	वि. प्र.		१		१	
११	हे. अ.	५/६ जी	अशासन	हे. अ.		०		१	
१२	सद-इन्जिनियर	५ जी	इन्जि.	विधित		१		५	
१३	अ.स.न.इन्जिनियर	जीपी	इन्जि.	विधित		१		०	
१४	स.अ.स.न.इन्जिनियर वि.प्र.	जीपी	इन्जि.	विधित		१		१	
१५	आ.न.स.टे.	जीपी/पा.पी	इन्जि.	विधित	ल्यानोडरी	१		५	
कार्यालय वर्क जम्मा						१६	०	१०	
नदः कार्यालय (१० घटा)								०	
१६	रुडपुन	५ जी	अशासन	सा.प.		२		४	
१७	सद-इन्जिनियर	५ जी	इन्जि.	विधित		४		४	
१८	सहायक	जीपी	अशासन	सा.प.		०		२	
१९	अ.स.न.इन्जिनियर	जीपी	इन्जि.	विधित		६		६	
								०	

बराहताल गाउँपालिकाको स्वीकृत दरबन्दी तेरिज

गाउँकार्यपालिका र अन्तर्गतको संगठन संरचना

सि.न.	पद	तह/ श्रेणी	सेवा	समुह	उपसमुह	स्वीकृत दरबन्दी	कैफियत
१	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	रा प तृतीय	प्रशासन	सामान्य प्रशासन	-	१	मौजुद
२	अधिकृत	७/८ औ	शिक्षा	शि. प्रशासन	-	१	मौजुद
३	अधिकृत	६/७ औ	प्रशासन	सामान्य प्रशासन	-	२	१ मौजुद १ रिक्त
४	अधिकृत	६/७ औ	प्रशासन	लेखा	-	१	मौजुद
५	ईन्जिनियर	६/७/८ औ	ईन्जिनियरिङ्	सिभिल	जनरल	१	मौजुद
६	हे.अ.	५/६ औ	स्वास्थ्य	-	-	२	मौजुद
७	प्रशासन सहायक	५ औ	प्रशासन	सा.प्र.	-	४	२ मौजुद २ रिक्त
८	आन्तरिक लेखा परीक्षक	५ औ	प्रशासन	लेखा	-	१	मौजुद

बराहताल गाउँपालिकाको स्वीकृत दरबन्दी तेरिज

गाउँकार्यपालिका र अन्तर्गतको संगठन संरचना

सि.न.	पद	तह/ श्रेणी	सेवा	समुह	उपसमुह	स्वीकृत दरबन्दी	कैफियत
९	लेखा सहायक/ लेखापाल	५ औ	प्रशासन	लेखा	-	१	मौजुद
१०	कम्प्युटर अपरेटर	५ औ	विविध		-	१	मौजुद
११	प्राविधिक सहायक	५ औ	शिक्षा	शिक्षा प्रशासन	-	१	रिक्त
१२	सब ईन्जिनियर	५ औ	ईन्जिनियरिङ्	सिभिल	-	२	१ रिक्त
१३	असिस्टेन्ट सब ईन्जिनियर	४ औ	ईन्जिनियरिङ्	सिभिल	जनरल	१	मौजुद
१४	सहायक महिला विकास निरीक्षक	४ औ	विविध	-	-	१	मौजुद र २ जना अतिरिक्त
१५	खा.पा.स.टे.	४/५ औ	ईन्जिनियरिङ्	सिभिल	स्यानिटरी	१	मौजुद
कुल जम्मा						१९	

बराहताल गाउँपालिकाको स्वीकृत दरवन्दी तेरिज

बराहताल गाउँपालिका, सुर्खेत

कृषि विकास शाखा/कृषि सेवा केन्द्र

सि.न.	पद	तह/ श्रेणी	सेवा	समुह	उपसमुह	स्वीकृत दरबन्दी	कैफियत
१	कृषि विकास अधिकृत	७/८ औ	नेपाल कृषि सेवा		-	१	मौजुद *
२	प्रा.स.	५ औ	नेपाल कृषि सेवा		-	२	रिक्त
३	ना.प्रा.स.	४ औ	नेपाल कृषि सेवा		-	१	मौजुद
जम्मा						४ जना	

बराहताल गाउँपालिका, सुर्खेत

सि. न.	पद	तह/श्रेणी	सेवा	समुह	उपसमुह	स्वीकृत दरबन्दी	कैफियत
१	पशु विकास अधिकृत	७/८ औ	नेपाल कृषि सेवा	लापो डेडे	-	१	मौजुद
२	प्रा.स.	५ औ	नेपाल कृषि सेवा	लापो डेडे	-	१	रिक्त
३	प्रा.स.	५ औ	नेपाल कृषि सेवा	भेट	-	१	मौजुद
४	प्रा.स.	४ औ	नेपाल कृषि सेवा	लापो डेडे	-	१	मौजुद
५	ना.प्रा.स.	४ औ	नेपाल कृषि सेवा	भेट	-	१	रिक्त
जम्मा						५	३ मौजुद २ रिक्त

बराहताल गाउँपालिकाको स्वीकृत दरवन्दी तेरिज

बराहताल गाउँपालिका, सुर्खेत

स्वास्थ्य शाखा

सि.न.	पद	तह/ श्रेणी	सेवा	समुह	उपसमुह	स्वीकृत दरबन्दी	कैफियत
१	अधिकृत	६ औ	नेपाल स्वास्थ्य	हे ई	-	१	मौजुद
२	अधिकृत	६ औ	नेपाल स्वास्थ्य	जनरल नर्सिङ	-	१	मौजुद
जम्मा						२ जना	

बराहताल गाउँपालिका, सुर्खेत

सि.न.	पद	तह/ श्रेणी	सेवा	समुह	उपस मुह	स्वीकृत दरबन्दी	कैफियत
१	प्रशासन सहायक	५ औं	नेपाल प्रशासन	सा.प्र.	-	४	३ मौजुदा १ अतिरिक्त
२	सब ईन्जिनियर	५ औं	नेपाल ईन्जि.	सिभिल	-	४	रिक्त
३	प्रशासन सहायक	४ औं	नेपाल प्रशासन	सा.प्र.	-	६	३ मौजुदा ३ जगेडा
४	सब ईन्जिनियर	४ औं	नेपाल ईन्जि.	सिभिल	-	६	७ मौजुदा ३ जना करार सेवा वाट राखिएको
जम्मा						२० जना	

बराहताल गाउँपालिकाको स्वीकृत दरबन्दी तेरिज

स्वास्थ्य चौकि ५ वटा (हरिहरपुर, तुरङ्गा, कुनाथरी,
पोखरीकाँडा, लेखगाँउ)

सि. न.	पद	तह/श्रेणी	सेवा	समुह	उपसमुह	स्वीकृत दरबन्दी	कैफियत
१	सि.अ.हे.ब./हे.अ	६ औ	स्वास्थ्य	हे.ई.	-	५	मौजुद
२	सि.अ.हे.ब./हे.अ	५/६ औ	स्वास्थ्य	हे.ई.	-	५	मौजुद
३	सि.अ.न.मि.	५/६ औ	स्वास्थ्य	ज.न.	-	५	मौजुद
४	अ.हे.ब.	४/५ औ	स्वास्थ्य	हे.ई.	-	५	मौजुद
५	अ.न.मि.	४/५ औ	स्वास्थ्य	ज.न.	-	५	मौजुद
६	का स	श्रेणीविहिन	प्रशासन			५	मौजुद
जम्मा						३०	

बराहताल गाउँपालिकाको स्वीकृत दरवन्दी तेरिज

बराहताल गाउँपालिका, सुर्खेत

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र ५ वटा (तेलपानी, गाइनेकाँडा, बीउरेनी, रानीबन, सलैना)

सि. न.	पद	तह/ श्रेणी	सेवा	समुह	उपस मुह	विद्यमान कर्मचारी संख्या	कैफिय त
१	अ.हे.ब.	४/५ औ	स्वास्थ्य	हे.ई.	-	४ जना १ रिक्त	दरवन्दी स्वीकृत नभएको
२	अ.न.मि.	४/५ औ	स्वास्थ्य	हे.ई.	-	४ जना १ रिक्त	
३	का स	श्रेणीविहिन				५	
जम्मा						१३	

बराहताल गाउँपालिकाको स्वीकृत दरवन्दी तेरिज

बराहताल गाउँपालिका, सुर्खेत

सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाई ४ वटा (पाग्मा, चेपाङ, नयाँवन, थारी)

सि. न.	पद	तह/श्रेणी	सेवा	समुह	उपसमुह	विद्यमान कर्मचारी संख्या	कैफियत
१	अ.हे.ब.	४/५ औ	स्वास्थ्य	हे.ई.	-	४	दरवन्दी स्वीकृत नभएको
२	अ.न.मि.	४/५ औ	स्वास्थ्य	हे.ई.	-	४	
३	का स	श्रेणीविहिन				३ जना १ रिक्त	
जम्मा						१२	

बराहताल गाउँपालिका विद्यमान कर्मचारीहरुको अबस्था

गाउँकार्यपालिका र अन्तर्गतको संगठनमा भएका कर्मचारी संख्या

सि.न.	विवरण	तह	संख्या	कैफियत
१	गाउँपालिका स्थाई	४/५/६/७/८	३६ जना	७ शाखा ११ ईकाइ
२	रोजगार शाखा	५/६	३ जना	रोजगार संयोजक, रोजगार सहायक, प्रा.स.
३	भुमी शाखा	४	४ अमिन	
४	सुचना प्रविधी शाखा	६	१	
५	पंजिकरण कार्यक्रम	४/५	३	MIS अपरेटर र फिल्ड सहायक
६	गाउँपालिका करार	-	३६	वडाका का.स. तथा अन्य
७	OVOT कार्यक्रम	४	३	पशु प्राविधिक

बराहताल गाउँपालिका विद्यमान कर्मचारीहरुको अबस्था

गाउँकार्यपालिका र अन्तर्गतको संगठनमा भएका कर्मचारी संख्या

सि.न.	विवरण	तह	संख्या	कैफियत			
८	स्वास्थ्य करार		४३	२८ जना अहेब अनमी ल्या.टे. १५ जना का.स.			
९	स्वास्थ्य स्थायी	४/५/६ तथा श्रेणीविहिन	२७				
१०	मेडपा कार्यक्रम	२	२	ईडीएफ			
११	जगेडा कर्मचारी	२/४	६	घरेलु २ जिल्ला विकास १ महिला २ संघ तर्फको १			
१२	दैनिक ज्यालादारी		४	३ जना लगत प.कर्ता, १ जना ह.स.चा.			
जम्मा			१६८				

बराहताल गाउँपालिकामा भएका समस्याहरु

- दक्षजनशक्तीको अभाव ।
- कुनैमा शाखामा दरवन्दी भन्दा वढि कुनैमा कम भएको ।
- कामको चाप धेरै हुने शाखामा जनशक्ती कम हुनु ।
- दरवन्दी अनुसारको पारिश्रमिक कम हुनु ।
- कसको न्युनतम पारिश्रमिक कति हुने भन्ने एकिन नहुनु ।
- दरवन्दि स्वीकृत नभएर नै कर्मचारी नियुक्त हुन् ।
- क्षमता विकासका कामहरु धेरै कम हुनु ।
- गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन नभएकाले काम गर्ने वातावरण नहुनु ।

समस्या समाधानका उपायहरु

- दक्ष जनशक्तीलाई तालिम दिन पहल भएको ।
- पद अनुसारको पारिश्रमिकका लागि कार्यपालिका बैठकमा व्यापक छलफल हुने गरेको ।
- न्युनतम पारिश्रमिक कति हुने भन्ने कुरा एकिन गर्न कार्यपालिका बैठकमा व्यापक छलफल हुने गरेको ।
- दरवन्दि स्वीकृतका लागि O&M सर्भे भएको तर आधिकारीकता प्राप्त नगरेको हुँदा ऐन निर्माण पछि O&M सर्भे गराउने पहल भएको ।
- क्षमता विकासका कामहरुमा बजेट विनियोजन भएको ।
- गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण हुँदै गएको ।

जिज्ञासा

धन्यवाद

आ.व.२०७९।०८० मा संचालित योजनाहरुको बार्षिक प्रगति समिक्षा

आ.व.२०७९/०८० को वडागत योजनाको प्रगति विवरण

वडा नं १

सि नं	योजनाको नाम	विनियोजन बजेट	बजेट खर्च	लागत अनुमान	कार्य सम्पन्न	आर्थिक प्रगति	भौति क प्रगति	कैफिय त
१	मंग्राह घोरेटो बाटो निर्माण	100,000.00	99,242.00	113258.00	112463.25	99.30	100%	गा पा
२	पाखापानी देखी सम्मेनी सम्म सडक निर्माण	750,000.00	460,471.00	831206.00	524201.00	63.07	100%	गा पा
३	भित्रीखोला सिंचाई योजना	300,000.00	285433.00	336708.00	321413.00	95.46	100%	गा पा
४	श्रीचौर खा.पा. योजना	600,000.00	540000.00	668000.00	632000.00	94.61	100%	गा पा
५	अमिलाबारी खा.पा योजना	300,000.00	285000.00	317736.89	325650.00	102.49	100%	गा पा
६	गाडापानी विधालय पाता खरिद	100,000.00	96,000.00	98000.00	98000.00	100.00	100%	गा पा
७	बसन्त प्रा.वि. काफलगैरा शौचालय निर्माण	351,000.00	339154.00	397318.00	383910.00	96.63	100%	गा पा
८	तेलपानी देविको मन्दिरमा प्रतिक्षालय निर्माण	250,000.00	243277.09	277671.08	270612.87	97.46	100%	गा पा
९	पानी घट्ट निर्माण	200,000.00	185,000.00	220000.00	218000.00	99.09	100%	गा पा

आ.व.२०७९/०८० को वडागत योजनाको प्रगति विवरण

वडा नं १

सि नं	योजनाको नाम	विनियोजन बजेट	बजेट खर्च	लागत अनुमान	कार्य सम्पन्न	आर्थि क प्रगति	भौति क प्रगति	कैफिय त
१०	ने.रा.आ.वि. तेलपानी तारजाली निर्माण	200,000.00	200000.00	231068.94	231068.94	100.00	100%	गा पा
११	गाडापानी स्वास्थ्य फिल्ड निर्माण	1,000,000.00	960000.00	1032000.00	1022000.00	99.03	100%	गा पा
१२	तिखेचुले डाँडा देखि कप्सेरी सम्म सडक निर्माण	2,000,000.00	900000.00	1060000.00	1040000.00	98.11	1000%	प्रदेश शर्सित
13	तेलपानी माथिल्लो गाउँ रिङ्ग रोड	1,000,000.00	600,000.00	750000.00	720000.00	96.00	100%	गा पा
१४	बर्थिङ्ग सेन्टर भवन निर्माण	1,000,000.00	960,000.00	988000.00	972000.00	98.38	100%	गा पा उपाध्यक्ष
१५	तेलपानी विधालय गेट निर्माण	100,000.00	85,000.00	92000.00	88000.00	95.65	100%	गा पा
	जम्मा	8,635,000.00	6,622,577.09	7796966.91	7343319.06			

आ.व.२०७९/०८० को वडागत योजनाको प्रगति विवरण

वडा नं २

सि नं	योजनाको नाम	विनियोजन बजेट	बजेट खर्च	लागत अनुमान	कार्य सम्पन्न	आर्थिक प्रगति	भौतिक प्रगति	कैफिय त
१	गिरीघाट थापाडेरा सडक मर्मत	900,000.00	897,918.25	898,963.59	897,918.25	99.77	99.88	j*f
२	थापाडेरा देखि मसाने सडक मर्मत	900,000.00	898,664.93	897,171.64	898,664.93	99.85	100.17	j*f
३	मसाने डाडाँ देखि सिस्नेरी सडक स्तरउन्ती	750,000.00	743,068.56	746,255.99	743,068.56	99.08	99.57	j*f
४	8f]Ksf kfgL 9n af6f] lgdf0f{ of]hgf	400,000.00	388,833.61	397,779.89	388,833.61	97.21	97.75	j*f
५	a8rp/ l;rfO kfOk vl/b e]/L df=lj= /fgL3f6	150,000.00	145,797.80	173,295.05	168,882.74	97.20	97.45	j*f
६	/u+/f]ug ug]{	100,000.00	100,000.00	121,093.49	118,263.54	100.00	97.66	j*f
७	lelqs'gf lar s'nf] sNe6{ lgdf{0f	150,000.00	150,097.21	177,873.87	175,796.50	100.06	98.83	j*f
८	hghfu[lt k f=lj= lelqs'gf zf}rfno dd{t ug]{{ lgdf{0f	40,000.00	40,000.00	48,268.12	52,774.04	100.00	109.34	j*f
९	kfUdf l/u/f]8 sNe6 lgdf{0f	240,000.00	235,644.08	278,974.09	274,400.37	98.19	98.36	j*f

आ.व.२०७९/०८० को वडागत योजनाको प्रगति विवरण

वडा नं २

सि नं	योजनाको नाम	विनियोजन बजेट	बजेट खर्च	लागत अनुमान	कार्य सम्पन्न	आर्थिक प्रगति	भौतिक प्रगति	कैफिय त
१०	dfgk'/ b]lv e'/L df=la= hfg] uf]/]6f] af6f] lgdf{0f of]hgf	350,000.00	344,465.07	406,870.44	401,058.76	98.42	98.57	uf=kf
११	dfgk'/ l;rfO{ s'nf] lgdf{0f of]hgf	1,000,000.00	991,579.21	1,149,957.07	1,141,115.23	99.16	99.23	uf=kf
१२	l;v/jf; af6f] lgdf{0f	150,000.00		176,602.44	166,813.27	0.00	94.46	j*f
१३	झुलुङ्गे पुल देखि गल्छेना बाटो मर्मत	52,000.00	52,000.00	52,000.00	51,576.00	100.00	99.18	j*f
१४	थापाडेरा सिरान बाटो मर्मत	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00	100.00	j*f
१५	कुसुमबास मेटर तथा पाईप खरिद	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00	100.00	j*f
१६	डेफ्का कतिक्षालय निर्माण	300,000.00	296,107.49	352,939.82	348,852.68	98.70	98.84	j*f
१७	कालशैनी मन्दिर घेरबार	150,000.00	150,000.00	173,036.56	173,036.56	100.00	100.00	j*f
१८	laho>/L df=lj= ljwfno /u+/f]ug ug]x	100,000.00	100,000.00	116,548.35	115,462.73	100.00	99.07	j*f

आ.व.२०७९/०८० को वडागत योजनाको प्रगति विवरण

वडा नं २

सि नं	योजनाको नाम	विनियोजन बजेट	बजेट खर्च	लागत अनुमान	कार्य सम्पन्न	आर्थिक प्रगति	भौति क प्रगति	कैफिय त
१९	lzv/af; dflyNnf] 6f]n sNe6{ lgdf{0f	175,000.00	175,000.00	201,564.95	201,897.25	100.00	100.16	j*f
२०	l;:g]/L vfg]kfgL dd{t g]=/f=k f=lj 8f]Ksf	100,000.00	100,000.00	115,086.96	114,984.60	100.00	99.91	j*f
२१	sDkfp8 dd{t g]=/f=k f=lj l;:g]/L	80,000.00	80,000.00	88,275.28	89,013.44	100.00	100.84	j*f
२२	zf}rfno dd{t wgf}nL vx/] vf]nf /fgL3f6	40,000.00	40,000.00	46,777.03	46,738.13	100.00	99.92	j*f
२३	t6aGw a/fxtfn dlGb/ 6f]n s[lif ;8s	2,000,000.00	1,977,433.94	2,344,309.6 1	2,320,615.25	98.87	98.99	k b]z
२४	of]hgf 6++sL vf]nf t6aGw	320,000.00	311,348.00	368,546.09	357,605.24	97.30	97.03	uf=kf
२५	a/fxtfn l/Ug] ;f]tL vf]O l;rfO	1,500,000.00	1,360,645.26	1,734,948.3 0	1,588,625.82	90.71	91.57	k b]z
२६	s'nf] lgdf{0f of]hgf	500,000.00	500,000.00	575,742.65	590,915.35	100.00	102.64	uf=kf
२७	lzv/jf; sNe6{ lgdf{0f	60,000.00	60,000.00	60,048.67	60,286.03	100.00	100.40	j*f

आ.व.२०७९/०८० को वडागत योजनाको प्रगति विवरण वडा नं २

[illegible]

आ.व.२०७९/०८० को वडागत योजनाको प्रगति विवरण वडा नं ३

सि नं	योजनाको नाम	लागत अनुमान	खर्च रकम	भौतिक प्रगति	कैफियत
१	बराह आवी खानेपानी मर्मत तथा कक्षकोठा ब्यबस्थापन	642553.3558	627017.4373	100	
२	गुराशे सिचाई कुलो निर्माण	1674489.911	1632688.877	99	
३	भैरव नेरा आ वि फिल्ड निर्माण सुकुर्माँला	614803.894	594508.5492	100	
४	मालिका प्रावि फिल्ड निर्माण केलाडी	660771.6	654929.1332	89	
५	गुरासे बाटो निर्माण	117360	117360	100	
६	सुकुरमाला गाईनेकाडा सिध्रागैरा हुदै बुनगाड बाटो निर्माण	2297749.1	1957086.47	92	
७	गुरासे बाटो निर्माण	576565	552309.118	100	
८	पशु डीप पोखरी निर्माण	57000	57000	100	
९	काली आप सालघारी सिचाई कुलों	274343.4957	233554.6366	95	
१०	तिते पानि खानेपानी गुरासे	159626.5467	157749.8651	100	

आ.व.२०७९/०८० को वडागत योजनाको प्रगति विवरण वडा नं ३

सि नं	योजनाको नाम	लागत अनुमान	खर्च रकम	भौतिक प्रगति	कैफियत
११	कृषि प्रयटकिय सडक मर्मत	369171.6215	359009.3196	100	
१२	बायुउर्जा मर्मत हरेकाडा	302576.8856	265154.8856	99	
१३	बुन्गाड खानेपानी मर्मत	159626.5467	159399.6077	100	
१४	डोपका लेखगाउ बाटो निर्माण	608347	603350.47	89	
१५	ढल्के आप सिचाई कुलो निर्माण	1666739.456	1657494.749	100	
१६	पुर्णदेवी विधालय गाइनेकाडा	496848.36	454879.3268	92	
१७	डोप्का लेखगाउ सडक निर्माण	840000	830000	100	
१८	छाप्रेको बडाथाई हुदै पराचुली डाडा देखि वडा ३ जोड्ने सडक	997630.4949	636500	90	
	जम्मा	12516203.27	11549992.44		

आ.व.२०७९/०८० को वडागत योजनाको प्रगति विवरण वडा नं ४

सि नं	योजनाको नाम	लागत अनुमान	खर्च रकम	भौतिक प्रगति	कैफियत
१	बाटो मर्मत वडा कार्यालय देखि विधालय सम्म	228913.625	221891.9863	100	
२	ढुंगेखाल ताल कुलो निर्माण	342273.637	174980.6543	99	
३	गेरूपानी खोला तटबन्दन पटारे	674787	666117.78	100	
४	जनज्योति आ वि माथिल्लो तरंगा भवन पलास्टर र अन्य निर्माण	932039.3677	0	89	
५	खनटेखोला नहर मर्मत बराताल	229851.344	220265.8117	100	
६	गुरुवाथान मन्दिर घेरवार तथा मर्मत सम्भार	1110611.862	1075904.393	92	
७	पम्प सेट खरिद	400000	400000	100	
८	साझघाट देखि कसरी सिचाई कुलो निर्माण	2260815.654	1779973.94	100	
९	प्रगति शिल प्रावि	159721.0097	122770.3736	89	
१०	तरंगा स्वास्थ्य चौकीको माथिल्लो छतको खालि भागमा ट्रस्ट निर्माण	996967.56	987282.3536	100	
११	भेरी मा. वि . भवन निर्माण	3532117.603	3401095.224	92	
१२	घलेडाडा बाटो रेलिङ कार्य	558132.39	390422.59	100	
१३	जनज्योति आ. वि.माथिल्लो तरंगा अधुरो भवन निर्माण	2696908.375	2542835.182	100	

आ.व.२०७९/०८० को वडागत योजनाको प्रगति विवरण

वडा नं ४

सि नं	योजनाको नाम	लागत अनुमान	खर्च रकम	भौतिक प्रगति	कैफियत
१४	कुटा शिभमन्दिर निर्माण कार्य	558132.39	458060.8669	100	
१५	रामजानकी आबी कुटा घेरबार	522670.4754	489867.8316	99	
१६	सुखाटोल नहर निर्माण	339772.227	325336.8457	100	
१७	बतिसेखोला सिचाई कुलो तटबन्दन	626098.8	620848.8	89	
१८	खोप तथा गाउघर क्लिनिक भवन प्लास्टर तथा शौचालय निर्माण	620003.8422	505696.4119	100	
१९	जलुकेनी खानेपानी मर्मत	750850	750850	92	
२०	जनज्योति आ वि फर्निचर तथा सौचालय मर्मत	343109.4393	343109.4393	100	
२१	प्रतिक्ष्यालय निर्माण बराताल	363496.6057	354487.2428	100	
२२	तरंगा प्रतिक्ष्यालय निर्माण	404150.1446	381472.336	100	
२३	राम जानकि प्रा. वि. कुटा भवन निर्माण	4736905.541	4428757.862	92	
२४	स्वास्थ्य चौकी कुवा निर्माण	114507.39	112748.5281	100	
२५	सरस्वती आ वि फर्निचर निर्माण	111392.6	111392.6	100	

आ.व.२०७९/०८० को वडागत योजनाको प्रगति विवरण वडा नं ४

सि नं	योजनाको नाम	लागत अनुमान	खर्च रकम	भौतिक प्रगति	कैफियत
२७	निरागल मन्दिर निर्माण	605678	598026	100	
२८	माईमन्दिर निर्माण	1660044.64	1639677.56	92	
२९	वराहताल क्षेत्र भित्र भौतिक पूर्वधार सुधार	2832986.51	2323891.813	100	
३०	रिङ्गाउ देखि बनवारि टोल साजघट लिफ्टसिचाई योजना निर्माण	4275000	2558860.22	100	
३१	पटारे तटबन्धन निर्माण	659840	652000	98	
	जम्मा	32620624.79	27630774.56		

आ.व.२०७९/०८० को वडागत योजनाको प्रगति विवरण वडा नं ५

सि नं	योजनाको नाम	विनियोजन बजेट	बजेट खर्च	लागत अनुमान	कार्यसम्प न्न	आर्थि क प्रगति	भौति क प्रगति	कैफियत
1	मसिना चेपाङ्ग सडक स्तरोन्नती (समपुरक प्रदेश)	8400000.00	3925011.42	8399155.70	3559991.20	46.73	91	समपुरक प्रदेश
2	वडा नं. ५ को भवन निर्माण (अघिल्लो आवको निरन्तरता)	7497575.00	7051561.22	7497575.33	7051561.22	94.05	100	गापा
3	जनज्योती नमुना मावि भवन निर्माण	5000000.00	4960000.00	5983313.68	5927937.68	99.20	99	संघ
4	बड्डीचौर देखि सुन्दहारी कृष्ण मन्दिर पक्की सडक नाला निर्माण	3000000.00	2815000.00	3356989.50	3135068.89	93.83	93	प्रदेश
5	गाउँपालिकाको हलको ढलान तथा अन्य निर्माण	3000000.00	2805000.00	3275973.95	3067306.18	93.50	94	गापा
6	सिमलपानी रचा सडक ग्रावेल वडा नं.-५	2500000.00	1594117.00	2500141.95	1568812.95	63.76	98	गापा
7	सुरक्षित महिला आवासिय गृह बराहताल गा.पा ५ सुर्खेत	2500000.00	2470000.00	2757349.53	2709528.06	98.80	98.27	प्रदेश
8	श्री सरस्वती मा वि चेपाङ	2250000.00	2050000.00	3109634.24	2826669.40	91.11	90.90	संघ
9	भ्याकुने सिंचाइ निर्माण बराहताल	2000000.00	1980000.00	2195919.38	2167486.45	99.00	98.71	प्रदेश
10	भुल्केमुल खा पा आ, बराहताल 5 चेपाङ, सुर्खेत	1500000.00	500000.00	1642306.99	1333340.44	34	81.19	संघ

आ.व.२०७९/०८० को वडागत योजनाको प्रगति विवरण

वडा नं ५

सि नं	योजनाको नाम	विनियोजन बजेट	बजेट खर्च	लागत अनुमान	खर्च रकम	आर्थिक प्रगति	भौतिक प्रगति	कैफियत
11	तल्लो सुद्वारी -माथिल्लो सुद्वारी भुसंरक्षण कार्यक्रम बराहताल 5सुर्खेत	1500000.00	1493000.00	1636959.84	1623902.23	99.53	99.20	प्रदेश
12	तल्लो सुद्वारी ढल निकास योजना	1500000.00	1475000.00	1648916.05	1621571.72	98.33	98.34	प्रदेश
13	बोधीज्ञान तपोभूमि बुद्ध विहार परिसरमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण, बराहताल-५ सुर्खेत	1500000.00	1430000.00	1738949.80	1663566.46	95.33	95.67	प्रदेश
14	कुनाथरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना मर्मत	1000000.00	950000.00	1166835.64	1100820.04	95.00	94.34	प्रदेश
15	गिद्धमारे वादरेपानी सिँचाई कुलो निर्माण, बराहताल ५ सुर्खेत	1000000.00	985000.00	1072070.43	1053968.28	98.50	98.31	संघ
16	बोधिज्ञान तपोभूमि बौद्ध विहार स्तुपा निर्माण (अघिल्लो आ.व.को निरन्तरता)	950000.00	399500.00	4293990.00	3685113.95	42.05	85.82	गापा, प्रदेश
17	बड्डीचौर होमस्टे भवन धारा शौचालय निर्माण तथा फर्निचर खरिद वडा नं.-५	700000.00	685000.00	800158.75	780569.84	97.86	97.55	वडा
18	बादरेपानी सिचाइ पोखरी निर्माण गिद्धमारे वडा नं.-५	500000.00	460000.00			92.00		गापा
19	विजयसाल सिँचाइ पोखरी निर्माण नाउला वडा नं.-५	500000.00	478000.00	527465.66	502484.55	95.60	95.26	वडा
20	रुचा तल्लो सिचाई कुलो	500000.00	490881.68	564715.69	555141.45	98.18	98.30	गापा

आ.व.२०७९/०८० को वडागत योजनाको प्रगति विवरण वडा नं ५

सि नं	योजनाको नाम	विनियोजन बजेट	बजेट खर्च	लागत अनुमान	खर्च रकम	आर्थिक प्रगति	भौतिक प्रगति	कैफियत
21	बोधिज्ञान तपोभुमी बौद्ध विहार स्तुपा निर्माण	500000.00	497043.00	497043.00	497043.00	99.41	100.00	गापा
22	सरस्वती मा.बि. चेपाङ मर्मतसंभार वडा नं.-५	500000.00	479064.12	583120.91	561138.24	95.81	96.23	वडा
23	हल्दु अमलाखाली मुल संरक्षण	400000.00	375000.00	435216.69	406387.44	93.75	93.38	वडा
24	बड्ढीचौर सहरी सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति	300000.00	296509.77	298265.00	296509.77	98.84	99.41	गापा
25	वडा भरिका सडक मर्मत संभार	400000.00	189988.22	400248.11	189988.22	47.50	47.47	वडा
26	सुन्दहारी सडक निर्माण	300000.00	292859.04	298871.10	292859.04	97.62	97.99	वडा
27	बड्ढीचौर ख्रिष्टिय मण्डली तारवार निर्माण	300000.00	293485.00	325485.35	318970.34	97.83	98.00	वडा
28	भानु प्रा.वि. तारवार तथा मर्मत	300000.00	300000.00	361573.86	367252.21	100.00	101.57	वडा
29	सालघारी आमा समूह भवन मर्मत	300000.00	295000.00	339759.90	333920.96	98.33	98.28	वडा
30	सार्वजनिक शौचालय मर्मत तथा निर्माण साझेदारी	250000.00	216346.30	286306.92	252653.22	86.54	88.25	वडा

आ.व.२०७९/०८० को वडागत योजनाको प्रगति विवरण

वडा नं ५

सि नं	योजनाको नाम	विनियोजन बजेट	बजेट खर्च	लागत अनुमान	खर्च रकम	आर्थिक प्रगति	भौतिक प्रगति	कैफियत
31	माथिल्लो सुन्दहारी सडक स्तरोन्नती	200000.00	200000.00	200000.00	200000.00	100.00	100.00	गापा
32	आँपखोली सडक पूर्वाधार निर्माण योजना	200000.00	199200.00	215772.46	214894.43	99.60	99.59	गापा
33	अनुग्रह बेथेल चर्च भवन मर्मत	150000.00	137055.46	178579.72	165635.18	91.37	92.75	वडा
34	खारखोला कुलोको पिलर निर्माण र मर्मत	150000.00	148000.00	160779.07	159381.76	98.67	99.13	वडा
35	डिपिङ ट्याक निर्माण	110000.00	110000.00	110000.00	110000.00	100.00	100.00	वडा
36	धमालाखाली प्रा.वि. खानेपानी टंकी निर्माण	100000.00	93095.00	107207.11	100242.20	93.10	93.50	वडा
37	सिचाइका लागि पाइप खरिद	100000.00	97801.75	97801.75	97801.75	97.80	100.00	वडा
38	हातीखावा कुलो मर्मत	100000.00	99678.25	99678.25	99678.25	99.68	100.00	वडा
	जम्मा	51957575.00	43976197.23	59164131.31	50599197.00			

आ.व.२०७९/०८० को वडागत योजनाको प्रगति विवरण

वडा नं ६

सि नं	योजनाको नाम	विनियोजन बजेट	कुल लागत अनुमान	कार्य सम्पन्न अंक	भौतिक प्रगति	कैफियत
1	रफ/ सफ]7] ejg	4500000	5301116	4977124.56	100%	
2	cfwf/e't c:ktfn ;fd'bfoLs :jf:Yo k'j{wf/ ljsf;	2500000	2776212	2713021.62	100%	
3	j8f sfo{no ejg	3500000	4029799	3912423.19	100%	
4	dflyNnf] ljp/]gL l8kjfl/u	2500000	2713865	2667070.71	100%	
5	ljp/fgL vfg]kfgL dd{t	600000	677763.7	679976.85	100%	
6	;fd'bfoLs :jf:y OsfO{ k'hLut 'wf/	300000	317130.9	315251.92	100%	
7	sfn e}/j dlGb/ tf/af/ tyf ;+/lfOf	1500000	1663921	1657800.49	100%	
8	aGemf8] s'nf] lgdf0f{	100000	111097.6	107899.16	100%	
9	a'l6 b]lv ljp/]gL dbg e08f/L xfO{j0 hf]8g] af6f]	1000000	1060109	1056013.72	100%	
10	a'l6 l;rfO{ s'nf] lgdf0f{	500000	553540.9	544872.67	100%	

आ.व.२०७९/०८० को वडागत योजनाको प्रगति विवरण

वडा नं ६

सि नं	योजनाको नाम	विनियोजन बजेट	कुल लागत अनुमान	कार्य सम्पन्न अंक	भौतिक प्रगति	कैफियत
11	/t'/fo l;rfO{ s'nf] lgdf0f{	1500000	1637076	1075444.38	100%	
12	emf/v]t ;f]bfv]t t6aGwg	500000	562776	550788.59	100%	
13	emf/v]t sf7] k'n lgdf0f{	60000	83347.8	79739.32	100%	
14	nDsfg] dxfb]j dlGb/ lgdf0f{	100000	117779.2	120532.55	100%	
15	Ov]gL O{' ;fO{ rr{ 3]/af/ gnvf]nf vf]nf b]lv g/]z	250000	275325.4	279249.56	100%	
16	g]kfnLsf] 3/ ;Dd ;8s	500000	498966.9	496177.01	100%	
17	a'l6 b]lv Ov]gL ;8s :t/pGgtL	500000	498413.2	496266.16	100%	
18	a'l6 b]lv Ov]gL af6f] u]]jn	2500000	1179648	1168480.4	100%	
19	dflyNnf] ;nfkm' 8'8fn' vf]nf l;rfO{ s'nf] lgdf0f{	1000000	1106883	1090181.25	100%	
20	lap/fgL b]lv ;nfkm' ;Dd uf]ldOf ;8s	2000000			100%	

आ.व.२०७९/०८० को वडागत योजनाको प्रगति विवरण

वडा नं ६

सि नं	योजनाको नाम	विनियोजन बजेट	कुल लागत अनुमान	कार्य सम्पन्न अंक	भौतिक प्रगति	कैफियत
21	nfdfvfnLx'b} xf8]kfgL wgs'l6 ;8s	2000000	243044	221234	100%	
22	wgs'l6 afnlasf; lzlffno lgdf0f{	100000	112728.5	112991.82	100%	
23	wgs'l6 vfg]kfgL tf/af/	100000	110798.8	111091.17	100%	
24	Ov]gL ljWofno 3]/af/	1000000	1101781	1091100	100%	
25	j8fdf kfOk v/Lb	250000	250013	250012.98	100%	
26	a'l6 vfg]kgL dd{t	50000	49668.5	49668.5	100%	
27	8f8f xfGg] yfg k ltlffno lgdf0f{	200000	225251.3	220956.91	100%	
28	ljp/fgL vfg]kfgL lnkm6 6+sL lgdf0f{ tyf dd{t	100000	110911.6	117729.18	100%	
29	nfdfvfnL b]lv wgs'6L hfg] af6f] dd{t	35000	35118.61	34362.71	100%	
30	ljp/fgL k'/fgf] s'nf] dd{t	100000	99425.89	82481.21	100%	

आ.व.२०७९/०८० को वडागत योजनाको प्रगति विवरण

वडा नं ७

सि नं	योजनाको नाम	विनियोजन बजेट	खर्च रकम	भौतिक प्रगति	कैफिय त
1	karange sadak marmat	499000	495000	99.20	
2	kalyan nauli sadak	549000	547000	99.64	
3	bahune pani dakhi tallobari samma sadak	1280000	1264000	98.75	
4	kalyan shyaule to bedugau sadak	1300000	1286000	98.92	
5	thulogaun matethan hudai lamakhali jodne sadak	998000	982000	98.40	
6	cheuribari khanepani marmat	150000	146000	97.33	
7	netalitol khanepani marmat	90000	90000	100.00	
8	amaghar nirmarn	230000	226000	98.26	
9	ward karyalaya gherabar	1000000	967000	96.70	
10	lakharpata khanepani	400000	287000	71.75	
11	gheminekhola khanepani	150000	145000	96.67	

आ.व.२०७९/०८० को वडागत योजनाको प्रगति विवरण

वडा नं ७

सि नं	योजनाको नाम	विनियोजन बजेट	खर्च रकम	भौतिक प्रगति	कैफियत
13	paiyapani khaja ghar nirmarn	70000	63000	90.00	
14	suryajoti ma bi lamakhali school khanepani marmat	250000	189000	75.60	
15	ne ra ma bi nayaban school marmat	350000	350000	100.00	
16	tijugaira khanepani	1000000	900000	90.00	
17	shaulya school gherabar	1000000	1000000	100.00	
18	ne ra ma bi nayaban school hostel building construction	4900000	4300000	87.76	
19	dungrikhola sinchai kulo nirmarn	1300000	800000	61.54	
20	dipping tank nirmarn	100000	100000	100.00	
21	suryajyoti mabi lamakhali school construction	3600000	3350000	93.06	
22	karange khel maidan nirmarn	400000	385000	96.25	
	Total	21616000	19672000		

आ.व.२०७९/०८० को वडागत योजनाको प्रगति विवरण

वडा नं ८

सि नं	योजनाको नाम	कुल लागत अनुमान	कार्य सम्पन्न अंक	भौतिक प्रगति	कैफियत
1	cUg]:j/ dxfb]j Hof]ltln+u cr{gf jfjf wfd lZfjfnno ejg lgdf{Of	1,112,916.50	1,109,657.22	90.00	
2	jufn] cfxfn vfg]kfgL cfof]hgf	1703943.14	1552201.54	75.60	
3	j]nrf}/ wg]/L l/a /f]8	995550.7581	972490.7549	100.00	
4	cfdf ;d'x ejg dd{t bdf/	562453.04	533342.63	90.00	
5	e';g] /flgjg vfg]kflg cfof]hgf	2321464.92	2273084.73	100.00	
6	skf;] 8fF8fy/L vfg]kfgL cfof]hgf	1691213.09	1569011.85	87.76	
7	j]nrf}/ ;8s lgdf{Of	397,489.65	396840.18	61.54	
8	jbfntfn b]vL j8Lrf}/ ;8s dd{t	798,961.98	798180.359	100.00	
9	uj]gf jfnjflnsf ejg lgdf{f a/fxtfn	444933.87	441500.93	93.06	
10	kmnf6] vfg]kfgL cfof]hgf	228934.30	227463.45	96.25	
11	s'gfy/L w'n]rf}/ ;8s ulfe]n	1318664.463	1316225.11	100	

आ.व.२०७९/०८० को वडागत योजनाको प्रगति विवरण

सि नं	योजनाको नाम	कुल लागत अनुमान	कार्य सम्पन्न अंक	भौतिक प्रगति	कैफियत
12	/flgig cfd f ;d'x ejg dd{t lgdf{f	225411.43	223903.17	95.00	
13	r'nL 8f8f en]{gL ;8s lgdf{0f	296,439.85	283184.07	85.60	
14	x/L cf+Kf l;rfO{ of]hgf	221056.94	214878.85	100.00	
15	जय पुर डाडा खानेपानी योजना	1746934.88	1517443.26	90.00	
16	ufO{wf/f d'n vfg]kflg lgdf{f	565807.86	548406.58	100.00	
17	;f+#/] vf]nf l;+rfO{ s'nf] dd{t tyf kfO{k vl/b of]hg	226703.74	202593.60	87.76	
18	e}/j k f lj dd{t tyf 3]/jf/	497,177.40	468114.7436	91.54	
19	e6]3f/L /fgLjg ;8s dd{t	495403.00	460340	100.00	
20	वडा कार्यालय मर्मत तथा सार्वजनिक सौचालय निर्माण	507842.44	505069.09	93.06	
21	kflg wf/f x*\\s] k ltlffno glhs ;fj{hlgs ;f}rfno lgdf{f	552108.51	542985.82	96.25	
22	g]=/f cf=lj ejg dd{t a/fxtfn	331923.13	303758.00	96.00	
23	lftL EfPsf] k'jf{wf/ ;'wf/ g] /f cfjL s'dLsf]6	13700.22	12200	90.00	
	जम्मा	17,257,035.10	16,472,875.94		

आ.व.२०७९/०८० को वडागत योजनाको प्रगति विवरण

वडा नं ९

सि नं	योजनाको नाम	विनियोजन बजेट	कुल लागत अनुमान	कार्य सम्पन्न अंक	भौतिक प्रगति	कैफियत
1	लेखगाउँ स्वास्थ्य चौकी भवन ट्रसको हल निर्माण	230,000.00	2379220.51	2393775.14	100%	
2	स्वास्थ्य संग विविध कार्यक्रम (अपांग मैत्री शौचालयका लागि र्याम निर्माण लेखगाउँ स्वास्थ्य चौकीमा)	150,000.00	193626.92	192527.14	100%	
3	लामीछाने टोल नाला निर्माण	300,000.00	381542.09	382401.80	100%	
4	सामुदायिक स्वास्थ्य क्लिनिक थारी शौचालय तथा खानेपानी निर्माण	100,000.00	112384.86	111438.02	100%	
5	घोडाआँखे साउने देखी विद्यालय सम्म मोटर बाटो निर्माण	200,000.00	197030.70	196889.13	100%	
6	सरस्वती मावि फर्निचर खरिद	500,000.00	558409.00	557000.00	100%	
7	धारापानी लिफ्टिङ्ग खानेपानी, बराहताल गा पा ९ फिनिक्डा, सुर्खेत	2,000,000.00	2335218.29	2249179.99	100%	
8	घोडाआँखे खानेपानी निर्माण योजना	250,000.00	301375.46	245945.96	100%	
9	बालभैरब थारी झ्याल ढोका निर्माण	200,000.00	225249.38	225249.38	100%	

आ.व.२०७९/०८० को वडागत योजनाको प्रगति विवरण

वडा नं ९

सि नं	योजनाको नाम	विनियोजन बजेट	कुल लागत अनुमान	कार्य सम्पन्न अंक	भौतिक प्रगति	कैफियत
10	श्रीमुल खानेपानी लिफ्टीङ्ग खा. पा. योजना	300,000.00	380419.3202	373292.58	100%	
11	शिवमन्दीर तथा रेलीङ्ग निर्माण	400,000.00	471347.61	449307.06	100%	
12	धारापानी लिफ्ट खानेपानी मर्मत	100,000.00	86165.84	54789.16	100%	
13	शिवमन्दिर तारबार योजना	150,000.00	169196.42	165197.64	100%	
14	सरस्वती मावि फर्निचर खरिद	500,000.00	558,409.00	557000.00	100%	
15	Saraswoti secondary school Building construction work	20,000,000.00	12388943.62	6874705.30	70%	
16	श्री मस्टा मन्दीर निर्माण	50,000.00	66229.38	67814.46	100%	
17	फिनिकांडा देखी 9 नं वडा कार्यालय सम्म ग्राभेल	2,000,000.00	1768540.28	1762605.94	100%	
18	ने.रा .प्रा.वि. पोखरीचौर ल्यापटप खरीद तथा वाईफाई जडान	115,000.00	115000.000	115000.000	90%	

आ.व.२०७९/०८० को वडागत योजनाको प्रगति विवरण

वडा नं ९

सि नं	योजनाको नाम	विनियोजन बजेट	कुल लागत अनुमान	कार्य सम्पन्न अंक	भौतिक प्रगति	कैफियत
19	भोटेधारा करेडांडा मोटर बाटो स्टर उन्नती तथा ट्रयाक ओपन	500,000.00	495162.84	375061.69	100%	
20	वडाको सबै बाटोहरु मर्मत	500,000.00	496972.31	495490.45	100%	
21	घोडाआंखे थारी सडक निर्माण	2,000,000.00	993367.625	694068.5725	80%	
	जम्मा	30,545,000.00	24673811.44	18538739.41		

आ.व.२०७८/०७९ को वडागत योजनाको प्रगति विवरण

वडा नं १०

सि नं	योजनाको नाम	विनियोजन बजेट	कुल लागत अनुमान	कार्य सम्पन्न अंक	भौतिक प्रगति	कैफियत
1	10 नं वडा कार्यालयको भवनको तला थप निर्माण	6,700,000.00	7621745.96	4595491.33	75%	
2	ओदालताल सलैना कटुवालडाडा सडक निर्माण समपुरक प्रदेश	8,400,000.00				
3	सल्लेरी भालु छेडा लिस्ने सडक सडक निर्माण	2,600,000.00	1644048.28	1624598.94	100%	
4	करकले लिफ्ट सिचाई कुलो निर्माण	500,000.00	529048.68	520441.95	100%	
5	माथील्लो बर्चाचौर मुहान देखी भित्रीखोला टाटीसम्म सिचाई कुलोनिर्माण	1,000,000.00	1098524.29	1015145.51	100%	
6	रोतोपोखरी देखी झेडीडांडा सडक निर्माण	700,000.00	687950.96	681211.64	100%	
7	सिमलचौर खा.पा. निर्माण	600,000.00	821248.54	810391.42	100%	
8	टाटी सार्वजनिक शौचालय निर्माण	300,000.00	322102.79	318203.55	100%	
9	हल्देखर्क खा.पा. मर्मत	400,000.00	502293.38	500097.86	100%	

आ.व.२०७९/०८० को वडागत योजनाको प्रगति विवरण

वडा नं १०

सि नं	योजनाको नाम	विनियोजन बजेट	कुल लागत अनुमान	कार्य सम्पन्न अंक	भौतिक प्रगति	कैफियत
10	चनाबारी मैकल हुदै बराहताल १० वडा कार्यालय रातपोखरी जोड्ने सडक	2,500,000.00	1848112.14	1345606.85	90%	
11	चिउरीपानी खानेपानी निर्माण		541641.43	545215.82	100%	
12	चिउरीपानी सिचाई योजना बराहताल गा.पा 10	1,500,000.00	1620751.95	1471937.45	100%	
13	कालीमाटी सडक निर्माण	300,000.00	295856.49	282653.06	100%	
	जम्मा	25,500,000.00	17533324.89	13710995.38		

आ.व.२०७९/०८० को कर्णाली जलपरियोजना र भकारी संग साझेदारी गरिएका योजनाहरुको प्रगति विवरण

सि नं	योजनाको नाम	लागत अनुमान	कार्यसम्पन	भौतिक प्रगति	कैफियत
१	ef]6]wf/f vfg]kfgL of]hgf	724,935.99	719,270.11	99.22%	19
२	l;:g]/L lnkm\6LË vfg]kfgL of]hgf	185,027.16	185,561.92	99.71%	20
३	8f]Ksf l8kaf]l/Ë vfg]kfgL of]hgf lgdf{Of ३of]hgf	552,984.39	553,310.04	100.00%	51
४	sl/ofkfgL vfg]kfgL of]hgf	896,797.42	853,743.76	95.20%	35
५	kf]v/Lsf8f+ wgs'6L lnkm\6 vfg]kfgL ५of]hgf	149,186.53	148,938.30	99.83%	32
६	jbfn 6f]8\s] ax'pkof]uL of]hgf	206,776.01	206,279.55	99.76%	12
७	s/Ë] vfg]kfgL of]hgf	1,537,671.37	1,584,733.01	96.56%	46
८	skf;] r'nL8f8fF lnkm\6LË vfg]kfgL ८of]hgf	281,741.62	280,500.47	99.56%	52
९	pbfb]nf wf/fkfgL lnkm\6LË vfg]kfgL ९of]hgf	1,719,682.87	1,619,224.61	94.16%	46
१०	yfkf 8]/f l8kaf]l/Ë tyf kfO{k nfOg lgdf{Of				

आ.व.२०७९/०८० को नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रमका योजनाहरुको प्रगति विवरण

सि नं	योजनाको नाम	विनियोजन बजेट	बजेट खर्च	लागत अनुमान	कार्य सम्पन	आर्थि क प्रगति	भौति क प्रगति	कैफियत
१	चेपांग मोति (सोतखोला)तडबन्दन कार्यक्रम	४५५००००	४४४२०००	५३९६६१८	५२५४४२३	९८	९७	NCCSP
२	साजघट भेरी तडबन्दन कार्यक्रम	३७५००००	३७३८०००	४४२६१९५	४४१२४३५	१००	१००	NCCSP
३	सुकुरमाला- निलरह तडबन्दन कार्यक्रम	५३५००००	५१८३०००	६२३६९३०	६०४०८५७	९७	९७	NCCSP
	जम्मा	१३६५००००	१३३६३०००	१६०५९७४३	१५७०७७१५			

आ.व.२०७९/०८० ठेक्काबाट संचालित योजनाहरुको विवरण

!	cfof]hgfsf] gfd	7]s]bf/ sDkgLsf] gfd	lalgof]lht /sd	7]Ssf /sd-Eof6 ;lxt_	;Demf}tf /sd - Eof6 ;lxt_
!	;/:jtL df=la= ejg lgdf{0f cf]bfntfn ;n}gf s6'jfn 8fF8f ;8s	cfo'if lgdf{0f ;j]f	20000000	19183935	12388943.62
@	lgdf{0f	a/fx lgdf{0f ;j]f	8400000	8016932	4831329.1
#	s'gfy/L w'nrf}/ x'b} j8f g+=% hf]8\g] ;8s u]fe]n	l;hfln sG:6«S;g k f=nL=	3000000	2909841	1318664.46
\$	;Nn]/L efn'5]8f ln:g] ;8s lgdf{0f	l;hfln sG:6«S;g k f=nL=	3600000	3455701	1644048.28
%	a'l6 b]lv lap/]lg dbg e08f/L /fhdfu{ hf]8\g] ;8s u]fe]n	k'Of{ lgdf{0f ;j]f	2500000	2400000	1180004.51
^	dl;gf r]kfE ;8s :t/pGglt	s/fO{r'ln sG:6«S;g P08 ;Knfo;{ k f=nL=	8400000	8063952	3925011.72
&	rgfafl/,d}sn j8f sfo{no b]lv /ftf] kf]v/L ;Dd ;8s lgdf{0f	cfO=P=sG:6«S;g	2500000	2425000	1246779.65
*	sNofg :ofpn] b]lv a]buf8 ;8s lgdf{0f	pTs[i6L lgdf{0f ;j]f	2500000	2423242	1380154.8
(	l;dnkflg /rf ;8s u]fe]n	czf]sf lgdf{0f ;j]f !	2500000	2425000	1848112.14
)	a]l /f= df=il= xfi:6ln eia lgdf{0f	!Gh/ lgdf{0f ;j]f			

आ.व.२०७९/०८० सिलवन्दि दरभाउबाट संचालित योजनाहरुको विवरण


l;=g +=	cfof]hgfsf] gfd	7]s]bf/ sDkgLsf] gfd	lalgof]lht /sd	7]Ssf /sd-Eof6 ;lxt_	;Demf}tf /sd - Eof6 ;lxt_
!	a]nrf}/ l/Ë/f]8 Ujfn]sf8fF ;8s :t/pGgtL	l;hfln sG:6«S;g k f=nL=	2000000	1919295	1131559.11
@	3f]8f cfFv] yfl/ ;8s lgdf{Of	b]plt aHo} sG:6«S;g	2000000	1938836	993367.63
#	lul/3f6 b]lv d;fg] hf]8\g] ;8s :t/pGgtL	xflb{s sG:6«S;g	1650000	1600500	693391.91
\$	kfUdf b]lv afË]tfn xflQvfn x'b} t[nkfgL hf]8\g] ;8s lgdf{Of	b]plt aHo} sG:6«S;g	2000000	1939992	1024987.29
%	ltv]r'ln 8fF8f b]lv sK;]/L ;8s lgdf{Of	b]plt aHo} sG:6«S;g	2000000	1919101	1038301.79
^	xf]:6]n v08sf] ;8s lgdf{0	Go" a/fxtfn sG:6«S;g	2000000	1917845	1836634.08
&	lap/]lg b]vL ;nfk' u fldOf ;8s lgdf{Of	Go" a/fxtfn sG:6«S;g	2000000	1939762	1739656.01
*	nfdfvfln xf8[kfgL b]lv wgs'l6 ;8s lgdf{Of	OGb sG:6«S;g	2000000	1939948	1638662.6
(	afx'g] kfgL b]lv tNnf] af/L ;Dd ;8s lgdf{Of	pTs[i6L lgdf{Of ;j]f	2000000	1919550	1375286.28

लागत अनुसार योजनाको संख्यात्मक विवरण

सि. नं	विवरण	योजना संख्या	कैफियत
१	१ लाख सम्मका योजना	८९	
२	१ लाख देखि ५ लाख सम्म	४८	
३	५ लाख देखि १० लाख सम्म	३४	
४	१० लाख देखि २० लाख सम्म	३९	
५	२० लाख देखि ५० लाख सम्म	३४	
६	५० लाख माथि	९	
	जम्मा	२५३	

लागत अनुसार योजनाको संख्यात्मक विवरण प्रतिशतमा हेर्दा

योजनाहरू




- १ लाख सम्मका योजना
- १ लाख देखि ५ लाख सम्म
- ५ लाख देखि १० लाख सम्म
- १०लाख देखि २० लाख सम्म
- २०लाख देखि ५० लाख सम्म
- ५०लाख देखि माथि

क्षेत्रगत अनुसार योजनाको संख्यात्मक विवरण

सि. नं	विवरण	योजना संख्या	कैफियत
१	पुर्वाधार विकास तर्फ	९५	
२	आर्थिक विकास तर्फ	६५	
३	सामाजिक विकास तर्फ	७२	
४	वातावरण र विपद तर्फ	११	
५	सुशासन तथा संस्थागत विकास	१०	
६	सुरक्षित आवास	२३०	
	जम्मा	४८३	

क्षेत्रगत अनुसार योजनाको संख्यात्मक विवरण प्रतिशतमा हेर्दा

क्षेत्रगत योजनाहरू

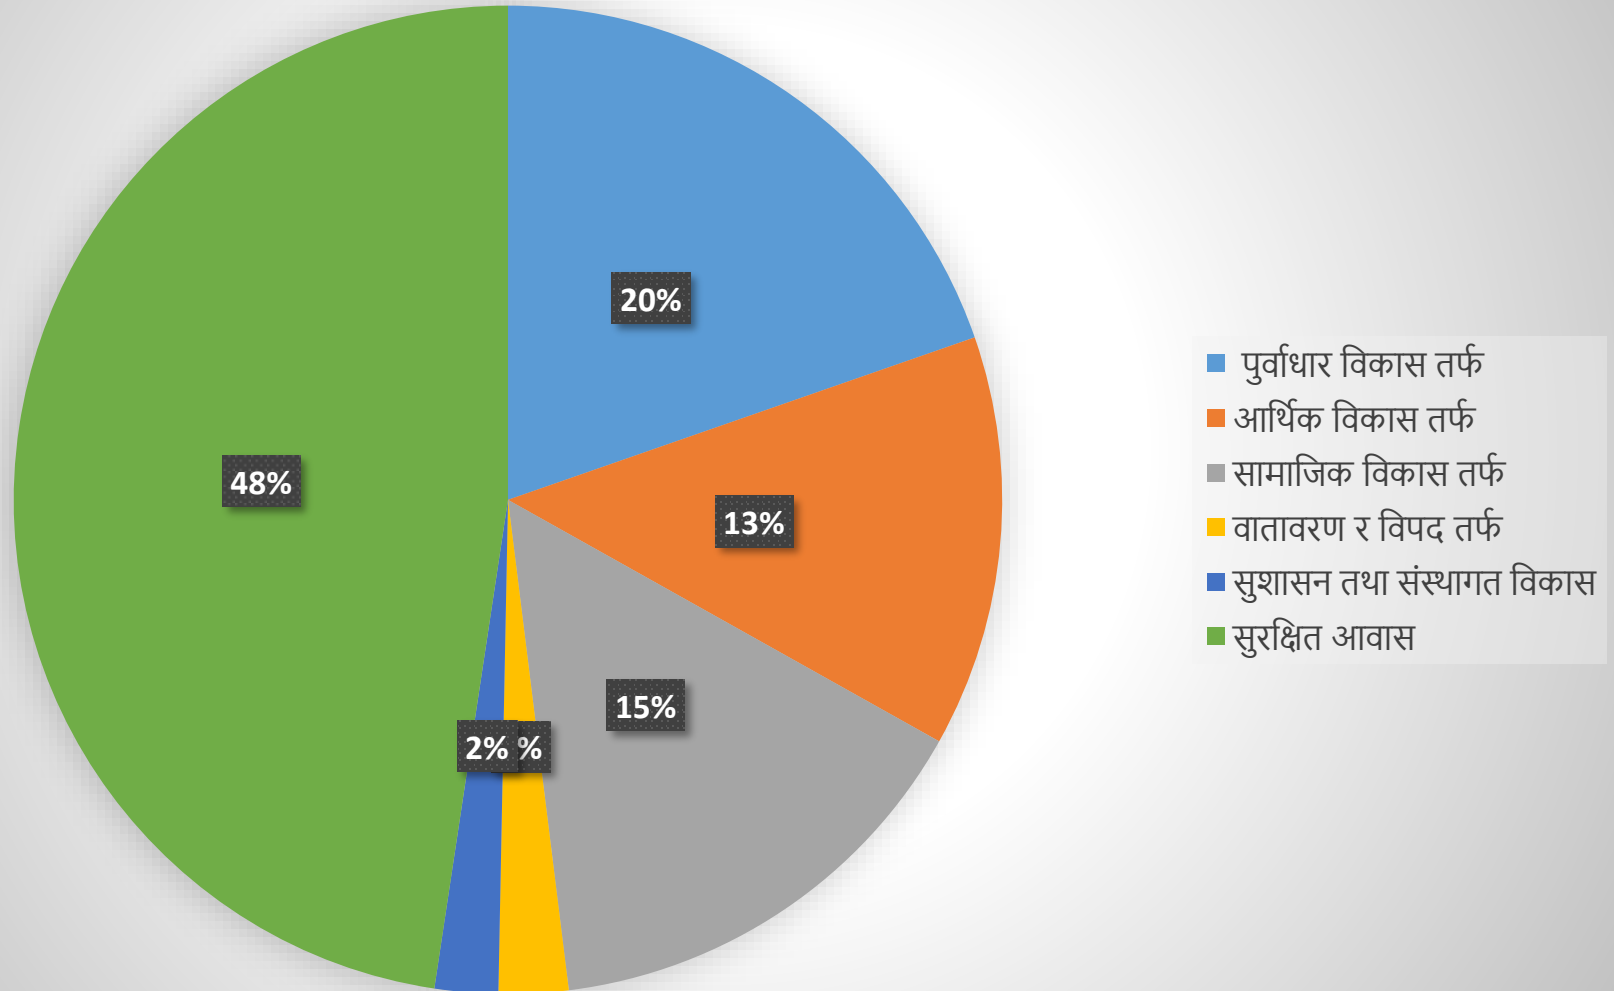


योजना संचालनका विधि र बजेट

सि. नं	जम्मा सम्झौता भएका योजनाहरु	जम्मा गाउँपालिका अनुदान	हाल सम्मको खर्च	बाँकी रकम	कै फिय त
उपभोक्ता समिति मार्फतका योजनाहरु	१८४	१२३२०१२०८	११३१३६४१९	१००६४७८९.१६	
ठेक्का मार्फत सम्झौता भएका योजनाहरु	१२	७५०१८८९१	५२८०६३४१	२२२१२५५०.४३	
संस्था मार्फत सम्झौता भएका योजनाहरु	१४	१२०७१०००	११९००४७५	१७०५२५.	
अमानत मार्फत सम्झौता भएका योजनाहरु	१८	५४४३१५	४४१२३३	१०३०८२.	
कोटेशन मार्फत सम्झौता भएका योजनाहरु	२५	३००१४०२४	२८०७९०८६	१९३४९३८.	
जम्मा	२५३	२४०८४९४३८	२०६३६३५५४	३४४८५८८४.५९	

યોજના સંચાલનકા વિધિલાઈ પ્રતિશતમા હેર્દા

યોજના સંચાલન પ્રકૃયા

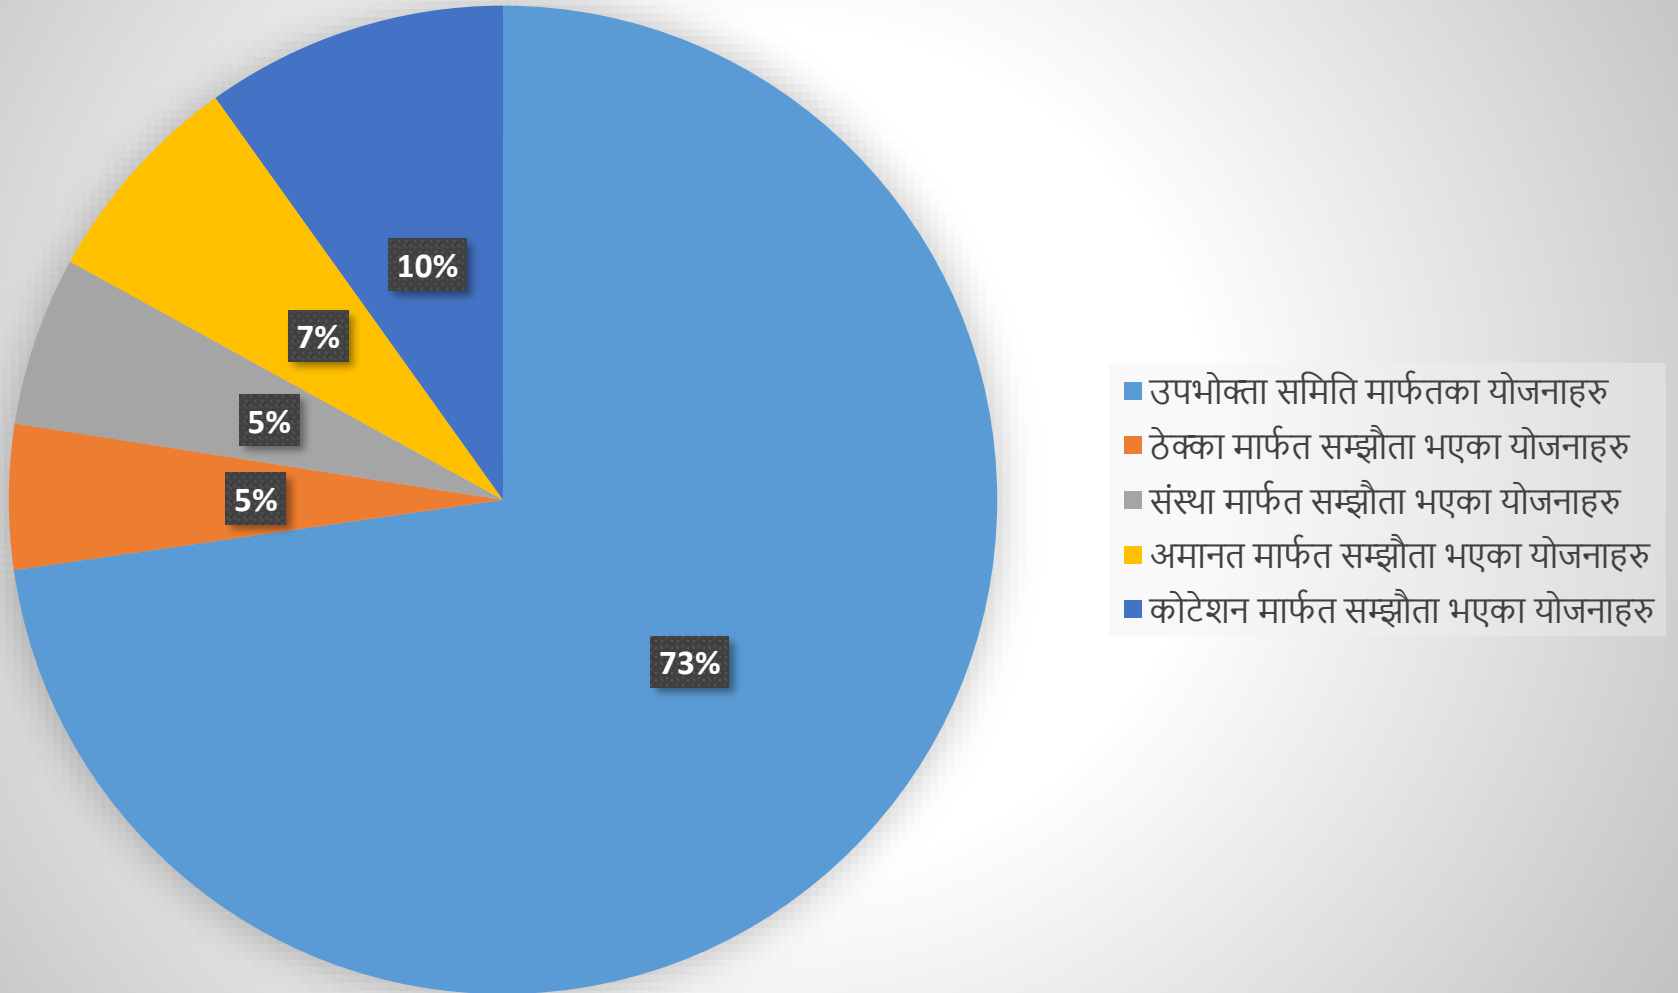

योजनाको भौतिक प्रगति विवरण

[illegible]

योजनाको भौतिक प्रगति विवरण

सि नं	क्षेत्र	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	जम्मा	इकाई
३	सिचाई तर्फ												
	पक्की कुलो	२००	२६०	२५०	८००	१५००	७५०. ५	५००	४७०	०	११३०	५८६०. ५	मि.
	कच्ची कुलो	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	मि.
	पाईप पम्पसेट बाट सिंचाई	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	मि.
	पाईप कुलो	०	१३०	०	१२०	०	०	०	०	०	०	२५०	मि.
४	भवन तर्फ												
	कार्यालय / वडाको भवन	०	०	०	१	१	१	०	०	०	१	४	वटा
	सामुदायिक भवन	०	०	१	२	०	०	०	३	०	०	६	वटा
	स्वास्थ्य चौकीको भवन	१	०	२	०	०	१	०	०	१	०	५	वटा
	सि	१	१	०	०	०	१	०	०	०	०	३	वटा

योजनाको भौतिक प्रगति विवरण

[illegible]

योजनाको भौतिक प्रगति विवरण

[illegible]

सि नं	क्षेत्र	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	जम्मा	इकाई
९	तडवन्धन												
	नदी नियन्त्रण	०	२	०	२	०	१	०	०	०	०	५	वटा
	ग्रहा सुधार तथा विक्षारोपण	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	वटा
	पैहो नियन्त्रण	०	०	१	२	२	०	०	०	०	०	५	वटा
१०	खेलकुद संरचना निर्माण												
	खेलकुद मैदान निर्माण	०	०	०	१	०	०	१	०	०	०	२	वटा
	अन्य	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	वटा
११	पर्यटन												
	मठ भन्दिर गुम्वा विहार मस्जित निर्माण	०	०	०	३	१	२	०	०	०	०	६	वटा
	होम स्टे निर्माण तथा मर्मत	४	०	०	०	१	०	०	०	०	०	५	वटा
	संग्रालय/बाजा भेषभुषा संरक्षण	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	वटा
	पदमार्ग निर्माण	०	१	०	१	०	०	०	०	०	०	२	वटा

योजनाको भौतिक प्रगति विवरण

[illegible]

cf=a= @)&(.)* df ;DkGg
ePsf of]hgfx?sf]
kmf]6f]x?

af]wL1fg tkf]e'ld af}2 laxf/ a8f g+=%



j8f g+= ^ sfof{no ejg



s{sn] kfgL l;Frfo{ kf]v/L j8f g+= !)




aufn]cfn vfg]kfgL RVT j8f g+= *



sfnef}/j dIGb/ lgdf{0f j8f g+=^



e'Ns]d'n vfg]kfgL of]hgf j8f g+=%

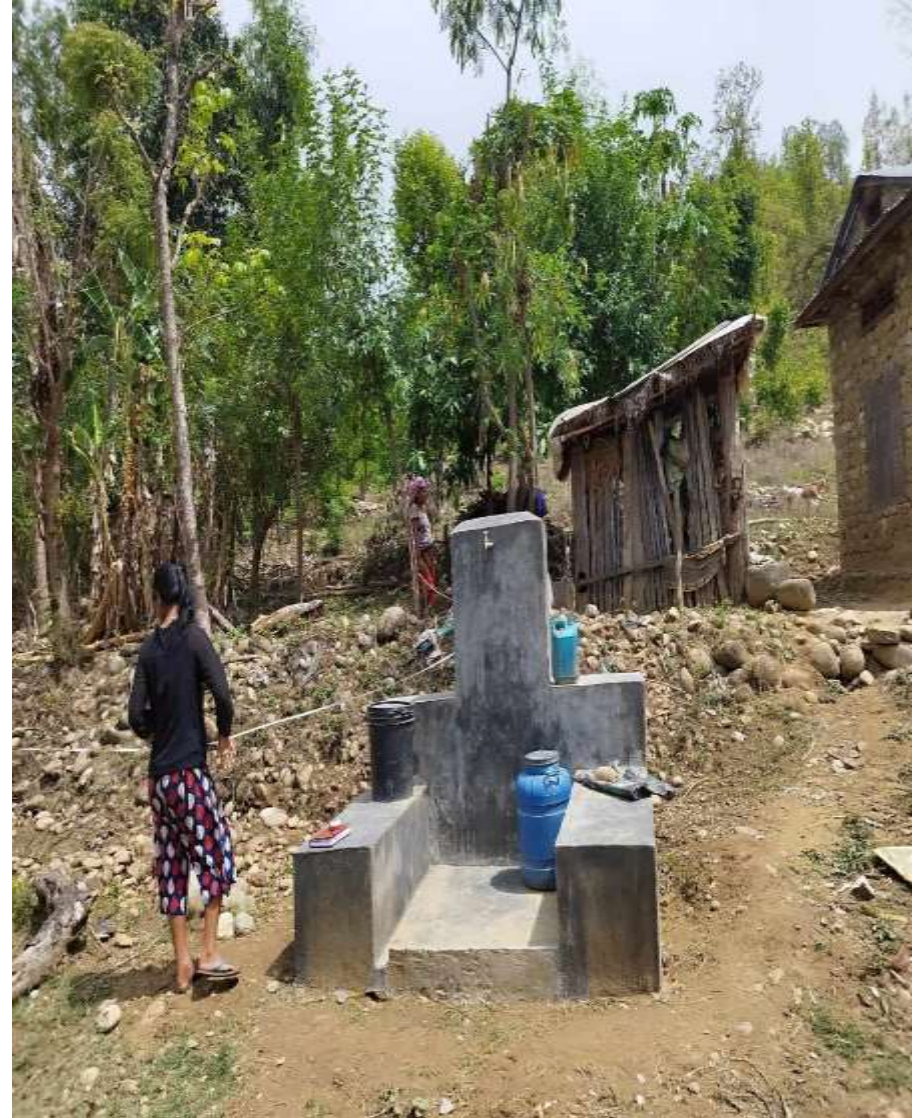

Eofs'g] l;Frfo{ s'nf] lgdf{0f j8f g+=%



;fnyf/L l;Frfo{ kf]]v/L lgdf{0f j8f g+=%



vx/]vf]nf t6aGwg j8f g+=@



नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रम ढोस्रो चरण




चेपांग मोति (सोल्खोला) तडबन्धन कार्यक्रम वडा नं. ४

साझघाट भेरी तडबन्धन कार्यक्रम वडा नं. ४



सुकुरमाला – निलरह तडबन्धन, वडा नं. ३

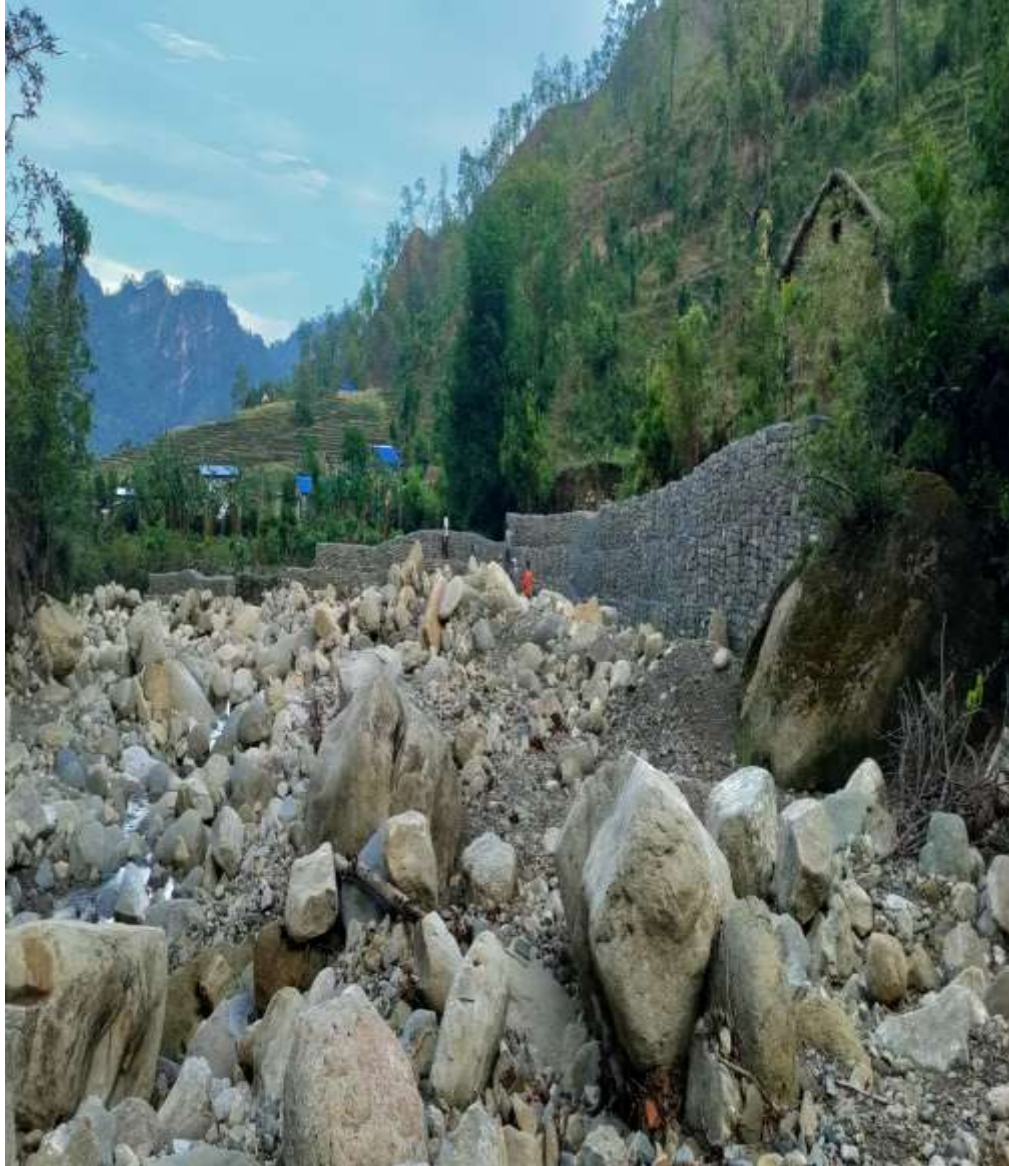

१० नं वडा कार्यालय भवन



हतेरि घाट झोलुङ्गे पुल



बराहताल गाउँपालिकामा केहि महत्वपूर्ण कामहरु

- गाउँपालिकाको ४ नं वडा कार्यालयको प्रशासनिक भवनको निर्माण कार्य अगाडि बढेको ।
- वडा नं १० र वडा नं ६ को वडा कार्यालयको भवन निर्माण सम्पन्न भएको ।
- एक घर एक धारा कार्यक्रम वडा सवै वडामा संचालन भएको ।
- भेरी पारीका केहि वडा र बस्ती बाहेक सवै वडाहरुमा मोटर बाटो पुगेर आवत जावतमा सजिलो भएको ।
- विद्यालयमा पक्की भवन र शौचालय निर्माण भएकोले पठनपाठन सहज हुदै आएको ।
- जिल्ला स्तरिय पालिका स्तरिय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता संचालन भएको ।
- हतेरि घाट झोलुङ्गे पुल लगाएत विभिन्न वडामा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएकाले आवत जावत गर्न सजिलो भएको ।

बराहताल गाउँपालिकामा केहि महत्वपुर्ण कामहरु

- विभिन्न लगानी कर्ताहरु थपिदै जानु ।
- औधोगिक ग्रामको डिपिआर भएर कामको शुरुवात हुनु ।
- विभिन्न स्थानहरुमा सिचाई कुलो निर्माण भइ उत्पादनमा बृदि भएको ।
- सडक बत्ति पानी र संचारको पौचमा बृद्धी हुनु ।
- ३८० घरधुरीमा खरको छाना हटाई जस्तापाताले छाएको ।
- बोदिज्ञान तपोभुमीको स्तुपा लगाएत अन्य संरचना निर्माण हुनु ।
- स्वास्थ्य चौकी आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको भवन निर्माण भएको र स्वास्थ्य सेवामा सहजता आएको ।
- जलउपयोग गुरुयोजना निर्माणको भएको ।
- सोलार लिफ्टिङ र डिपबोरिङबाट खानेपानी तथा सिचाई सुविधा पुगेको

बराहताल गाउँपालिकामा भएका समस्याहरु

- योजना छनौटमा पारदर्शिता र योजना निर्माणमा प्रकृया पालनाको कमी देखिनु ।
- योजना छनौट र योजना कार्यान्वयनमा ढिलाई ।
- योजना दिर्घकालिन सोच र उपलब्धि मुखि नभै वितरण मुखि भएको ।
- उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरु लाई तालिमको अभाव देखिएको ।
- टुक्रे योजनाबाट अपेक्षित नतिजा प्राप्त हुन नसकेको ।
- उपभोक्ता समिति गठनमा पारदर्शिता हुने नगरेको ।
- सिकर्मी र डकर्मीलाईको तालिम नदिनु कुन दक्ष र अर्ददक्ष हो एकिन नहुनु
- प्रभावकारी अनुगमनको कमी ।
- विकासमा राजनितिकरण हुनु ।
- हाल सम्म नविनतम खालका कुनै काम संचालन हुन नसक्नु ।
- जनशक्तीको अभाव ।

समस्या समाधानका उपायहरु

- गाउँपालिकामा भएका सार्वजनिक भवनमा र साविकको कुनाथरी गाविसको भवनमा दैनिक प्रशासनिक काम गर्दै आएको र थप भवन बनाउन गाउँसभामा पहल भएको ।
- कानुनी परामर्शदाता र कानुन विद् संग समन्वय गरेर कानुन निर्माण गर्नु पर्ने र गाउँपालिकामा भएका जनशक्तीलाई कानुन निर्माण र क्षमता विकास सम्बन्धी तालिमको लागि पहल भएको ।
- आन्तरिक श्रोतलाई प्राथमिकता दिएर राजस्व संकलनका क्षेत्र पहिचान गरी राजस्व संकलनमा उल्लेखनिय वृद्धी गर्दै जाने कार्यको थालनी भएको ।
- ठुला र नमुना योजना संचालनमा छलफल हुने गरेको ।

कुनै जिज्ञासा.....?

wGojfb
